

PROCEDURA PER RICHIESTA DI 1° AVVIAMENTO

iSeries CON MODULO IDRAULICO

POMPE DI CALORE ARIA / ACQUA

PRIMA DI RICHIEDERE L'AVVIAMENTO DEL SISTEMA:

1. CIRCUITO IDRAULICO

- Realizzare allacciamenti idraulici, riempire l'impianto, verificare la tenuta di tutti i raccordi/guarnizioni e spurgare l'aria;
- Rispettare i volumi minimi e le portate d'acqua necessari per un regolare funzionamento; vedi "Manuali di installazione" allegati al prodotto;
- In presenza di un serbatoio per acqua calda sanitaria, installare vaso di espansione;
- In presenza di un serbatoio per acqua calda sanitaria, installare un addolcitore;
- Se la pressione della rete idrica è elevata, installare un riduttore di pressione (max 2,5 bar)

2. CIRCUITO ELETTRICO

- Verificare l'alimentazione alla/e unità esterna/e;
- Verificare l'alimentazione alle unità interne, Hydrokit, Emix ed Emix Tank;
- Verificare il collegamento linea bus tra la/e unità esterna/e le unità interne;
- Verificare i collegamenti dei vari comandi di controllo installati;
- Verificare che siano installati gli opportuni sezionatori, sia per le unità esterne che per le interne come da Manuale Argo e Technibel;

3. CIRCUITO GAS REFRIGERANTE (iSeries)

- Eseguire i collegamenti a cartella tra unità interne ed esterna;
- Utilizzando l'apposita pompa del vuoto, effettuare il vuoto del sistema;
- Verificare tenuta del circuito frigorifero.

N.B. Fare sempre e comunque riferimento alle informazioni e schemi, che trovate nei manuali d'installazione inseriti negli imballi dei prodotti!

CONCORDARE CON CAT ARGOCLIMA, LA DATA D' AVVIAMENTO DEI SISTEMI.

4. NEI GIORNI PRECEDENTI IL PRIMO AVVIAMENTO:

- **Alimentare elettricamente l'unità esterna almeno 24 ore prima dell'appuntamento con il CAT, per consentire il preriscaldamento dell'olio del compressore.**

5. IL GIORNO STESSO

- Verificare che l'unità esterna sia alimentata elettricamente;
- Alimentare elettricamente le unità interne e i comandi di controllo;
- L'installatore che ha effettuato l'installazione dell'impianto, dovrà essere presente per tutta la durata dell'avviamento;

NON STAMPARE E NON INVIARE IN SEDE QUESTO MODULO

MODULO RICHIESTA PRIMO AVVIAMENTO SISTEMI A POMPA DI CALORE ARIA/ACQUA I SERIES CON HYDROKIT

LA PRESENTE RICHIESTA D'AVVIAMENTO DEVE ESSERE COMPILATA IN OGNI SUA PARTE E TRASMESSA VIA MAIL A: **argo.postvendita@argoclima.com**

ALMENO 10 GIORNI LAVORATIVI D' ANTICIPO RISPETTO ALLA DATA DELLA RICHIESTA.

Numero/Nome del progetto ARGOCLIMA

Nominativo Studio di progettazione/città/Tel.....

Rif. Bolla di consegna/data.....

Rif. Ubicazione Impianto (Nominativo utilizzatore).....
(Via / Città / Pr / Tel).....

Ragione Sociale Ditta Installatrice

(Via / Città / Pr / Tel).....

Nome dell'installatore presente all'avviamento.....


N° cellulare.....

Data (indicativa) richieste per l'avviamento

N.B. Inviare in allegato, copia del progetto d'impianto realizzato dal termotecnico. In mancanza del documento, non sarà possibile procedere all'avviamento dell'impianto.

Dati di progetto		
Temperatura esterna minima regionale	Carico Termico Invernale	Carico Termico Estivo
°C.....	kW.....	kW.....

Prodotti installati:(inserire nelle figure sotto riportate il tipo di prodotto-Mod.....)
Lunghezze tubazioni gas refrigerante:(inserire i metri vicino a L1/L2/ecc..)

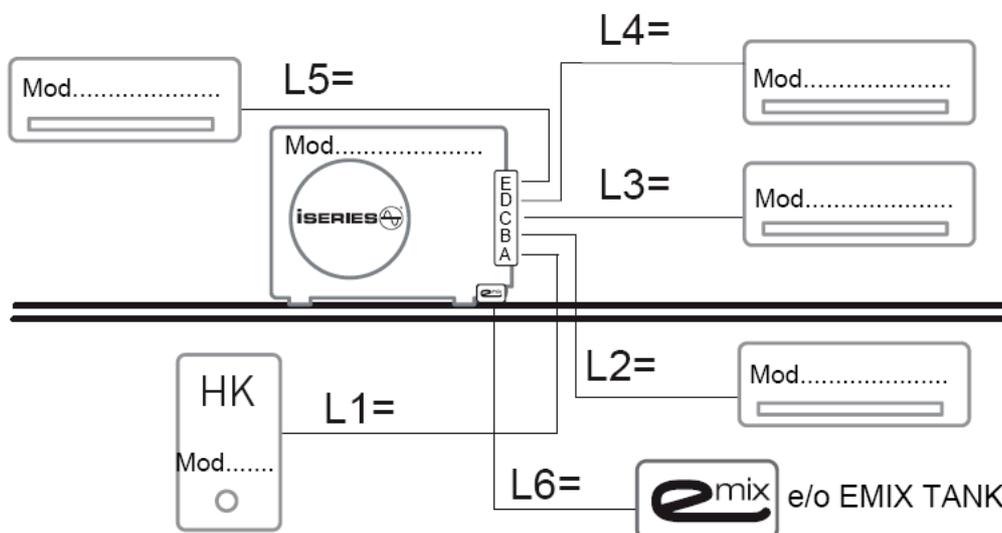

Modello prodotti idronici (PHRIE ecc.).....
 • Unità di controllo/comando (PHRIE).....
 • Separatore idraulico/serbatoio (capacità litri).....

Tipologia impianto:

Pavimento 1 zona Primario/secondario Unità terminali

Integrazione caldaia Radiatori Media Temperatura

Nel caso di sistemi iSeries, il 1° avviamento è a carico di Argoclima, SOLO ed ESCLUSIVAMENTE se nell'impianto è installata l'unità HYDROKIT / MODULO IDRAULICO

CONDIZIONI NECESSARIE PER L'AVVIAMENTO DEI SISTEMI

- | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1. ALLACCIAMENTO IDRAULICO, RIEMPIMENTO DEL CIRCUITO E SPURGO DELL'ARIA; | <input type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO |
| 2. PORTATA D'ACQUA E VOLUME MINIMO GARANTITO | <input type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO |
| 3. IMPIANTO ELETTRICO ESEGUITO RISPETTANDO GLI SCHEMI INDICATI NEL MANUALE D'INSTALLAZIONE IN DOTAZIONE ALL'UNITA'; | <input type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO |
| 4. L'ALIMENTAZIONE ELETTRICA DELLE UNITA' ESTERNE IN GRADO DI SUPPORTARE TUTTO IL CARICO ELETTRICO INDICATO NEI MANUALI DI INSTALLAZIONE (NON E' AMMESSA ALIMENTAZIONE ELETTRICA CON GENERATORI ELETTRICI); | <input type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO |
| 5. ALIMENTAZIONE ELETTRICA 220V PRESENTE SU TUTTE LE UNITA' INTERNE E GLI ACCESSORI DI GESTIONE IMPIANTO (COMANDI CENTRALIZZATI, TOUCH SCREEN O ALTRO); | <input type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO |
| 6. UNITA' ESTERNE ALIMENTATE ELETTRICAMENTE PER CONSENTIRE UN CORRETTO PRERISCALDAMENTO DEL CARTER DEL COMPRESSORE (ALMENO 24 ORE PRIMA); | <input type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO |
| 7. IN CASO DI PRESENZA DI COMANDI REMOTI, CENTRALIZZATORI O TIMER: CORRETTAMENTE COLLEGATI E ALIMENTATI COME DA MANUALE D'INSTALLAZIONE; | <input type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO |
| 8. ACCESSO ALLE UNITA' INTERNE ED ESTERNE PER CONTROLLI E MANUTENZIONE GARANTITO E IN SICUREZZA; | <input type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO |
| 9. PRESENZA IN CANTIERE, A CARICO DELL'INSTALLATORE, DI: BOMBOLA/E DI GAS REFRIGERANTE; BILANCIA E MANOMETRI NECESSARI PER LA CARICA REFRIGERANTE AGGIUNTIVA DELLE LINEE FRIGORIFERE (SE NECESSARIO). | <input type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO |

MODULO DA INVIARE IN SEDE ARGOClima: argo.postvendita@argoclima.com



NORME GENERALI

- IL TECNICO ARGOCLIMA PROVVEDERA' AD EFFETTUARE L'AVVIAMENTO DELL'IMPIANTO SOLO SE E' STATO REALIZZATO SECONDO LA REGOLA DELL'ARTE.
- QUALORA L'IMPIANTO NON DOVESSE RISULTARE CONFORME ALLE CONDIZIONI SOPRA RIPORTATE, NON VERRA' COLLAUDATO.
- INOLTRE, VI VERRA' ADDEBITATO IL COSTO DEL TECNICO O DEL CAT AUTORIZZATO, IN ACCORDO ALLE TARIFFE VIGENTI.

Nominativo dell'AGENZIA di VENDITA

NOTA PER IL CENTRO ASSISTENZA

In caso riceviate questo modulo direttamente dall'installatore, vi invitiamo a rigirarlo all'Ufficio Assistenza Tecnica ARGOCLIMA

NON INTERVENIRE SENZA NOSTRA AUTORIZZAZIONE

FIRMA E TIMBRO DEL RICHIEDENTE

DATA
