Documento valido solo per il territorio nazionale (Italia)

RICHIESTA PRIMO AVVIAMENTO POMPE DI CALORE ARGO GENERA

Spett.le **ARGOCLIMA S.p.A.**,

Con la presente siamo a richiedere il PRIMO AVVIAMENTO della pompa di calore ARGO **AGNHP.**

COMPILAZIONE OBBLIGATORIA DA PARTE DELL'INSTALLATORE RESPONSABILE DELL'IMPIANTO.

ATTENZIONE: per procedere con l'avviamento è necessario compilare tutti i campi richiesti.

IL MODULO COMPILATO IN MANIERA NON CORRETTA O INCOMPLETA POTRA' ESSERE RIFIUTATO.

NOME PROGETTO _____

Ubicazione impianto

Nome Sig./Società/Struttura_____

Via/Piazza _____ n°_____

Città _____ CAP _____ Prov. _____

Telefono _____ Email _____

Rivenditore/Agenzia di vendita: _____

Dati Installatore

Nome Sig./Società/Struttura _____

Via/Piazza _____ n°_____

Città _____ CAP _____ Prov. _____

Telefono _____ Email _____

Indicare preferenza centro assistenza (facoltativo) _____

Data indicativa richiesta per l'avviamento (ca. 10 giorni dall'invio della presente) _____

IMPORTANTE:

ALLEGARE IL PROGETTO OPPURE LO SCHEMA DI IMPIANTO, O DISEGNARLO NEL RIQUADRO SOTTOSTANTE, INDICANDO LE UNITÀ INSTALLATE, LE LUNGHEZZE ED I DIAMETRI DELLE CONNESSIONI, I DISLIVELLI E GLI APPARATI INSTALLATI (ES. VALVOLA A 3 VIE, RESISTENZE ECC.).

ALLEGARE INOLTRE ALLA PRESENTE RICHIESTA ANCHE UNA FOTO PANORAMICA DALLA QUALE SI POSSA EVINCERE L'INSTALLAZIONE ESEGUITA A REGOLA D'ARTE.

NOTE (facoltativo) _____

Unità installate:

1. **Modello**_____**matricola**_____**Id controller**_____
2. **Modello**_____**matricola**_____**Id controller**_____
3. **Modello**_____**matricola**_____**Id controller**_____
4. **Modello**_____**matricola**_____**Id controller**_____

DESCRIZIONE IMPIANTO:

	SÌ	NO
• L'impianto è costituito da circuito primario / secondario (il serbatoio inerziale funziona da separatore idraulico).	☐	☐
• Viene generata acqua calda sanitaria con la presente pompa di calore Se sì, indicare il volume del serbatoio dell'acqua calda sanitaria: _____ Litri.	☐	☐
• È presente una resistenza elettrica ad integrazione per il riscaldamento acqua calda sanitaria ACS.	☐	☐
• È stato connesso un termostato ambiente (non fornito) nella morsettiera del controller.	☐	☐
• È presente una resistenza elettrica ad integrazione per il riscaldamento lato impianto.	☐	☐
• Si vuole lavorare in curva climatica (regolazione della temperatura dell'acqua in funzione della temperatura esterna).	☐	☐

PRIMA DI RICHIEDERE L'AVVIAMENTO, CONFERMARE DI AVERE EFFETTUATO LE SEGUENTI VERIFICHE:

	SÌ	NO
• L'unità è stata collocata all'esterno dello stabile in cui è installata rispettando gli **spazi richiesti per l'installazione** ed i **requisiti necessari per l'installazione** indicati nei manuali ufficiali della casa madre;	☐	☐
• I prodotti sono stati installati **rispettando le prescrizioni di sicurezza per il refrigerante R290** riportati sui manuali di installazione e il CAT potrà operare in totale sicurezza come previsto dalle norme vigenti;	☐	☐
• Nell'area di protezione di sicurezza delimitata nella figura sopra sono presenti porte, finestre, bocche di lupo, tombini e/o altre grate a pavimento o parete;	☐	☐
• Nell'area di protezione di sicurezza delimitata nella figura sopra sono presenti fonti di innesco (fiamme libere, componenti impianto elettrico, automobili, motoveicoli, apparecchi elettrici non ATEX ecc);	☐	☐

	SÌ	NO
• Nell'area di protezione di sicurezza delimitata nella figura sopra sono presenti unità di modelli diversi o unità che utilizzano refrigeranti diversi da R290 o altri apparecchi elettromeccanici;	☐	☐

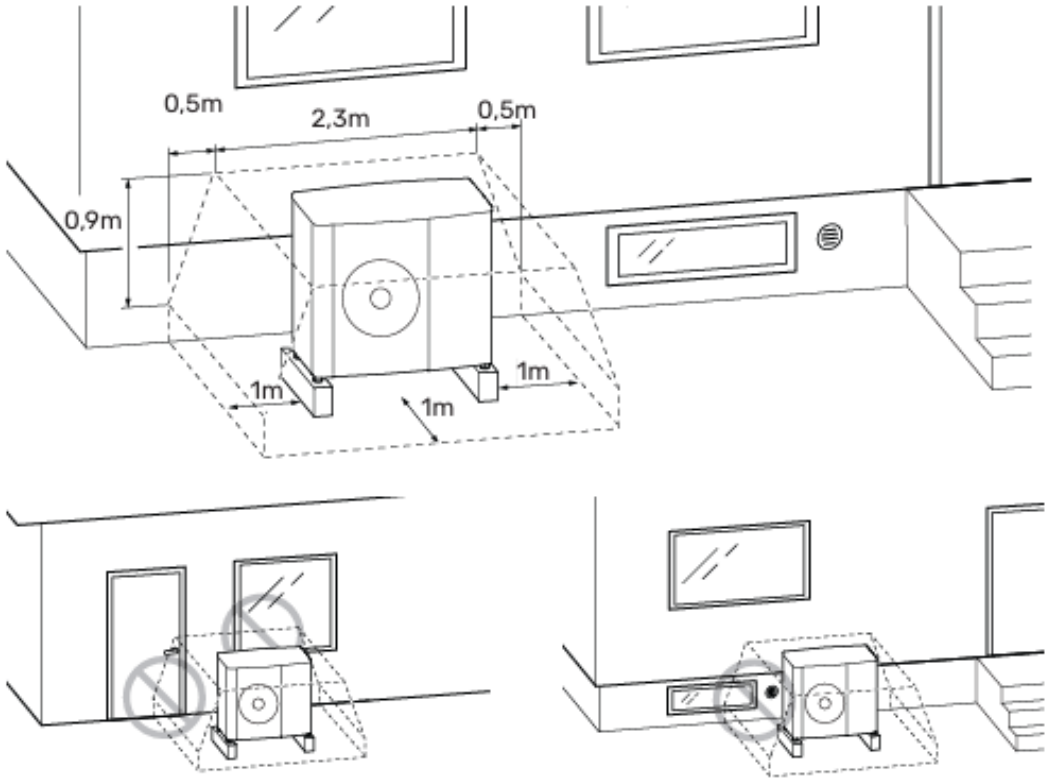

N.B.
ALLEGARE DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA RIFERITA ALL'INSTALLAZIONE DELLA POMPA DI CALORE.
LE UNITÀ INSTALLATE SENZA RISPETTARE I PRESENTI REQUISITI DI SICUREZZA NON SARANNO AVVIATE.

• L'alimentazione elettrica è conforme a quanto riportato sui manuali di installazione e sono state rispettate le sezioni e la tipologia dei cavi da utilizzare;	☐	☐
• Il collegamento idraulico è stato eseguito secondo le norme e le direttive vigenti, rispettando le dimensioni delle tubazioni e dei relativi raccordi;	☐	☐
• I tubi sono stati isolati come indicato nel manuale di installazione;	☐	☐
• L'impianto è stato accuratamente lavato; è stato installato il filtro dell'acqua all'ingresso della PDC (*pena la decadenza della Garanzia*);	☐	☐
• È stato verificato il riempimento dell'impianto idraulico come riportato sui manuali di installazione;	☐	☐
• **La portata d'acqua per la pompa di calore è sempre garantita;**	☐	☐
• Il volume minimo di acqua nell'impianto è garantito;	☐	☐

	SÌ	NO
• È stato installato un vaso di espansione idoneo lato impianto;	☐	☐
• È stato installato un vaso di espansione idoneo lato sanitario ACS;	☐	☐
• È stato installato un addolcitore (verificare PH e durezza acqua);	☐	☐
• Il circuito idraulico è stato messo in pressione e degasato prima del caricamento.	☐	☐
• Sono state installate le valvole antigelo (obbligatorie) come riportato sui manuali di installazione	☐	☐
• **Solo per sistemi in cascata** sono stati correttamente modificati gli indirizzi (switch) in ogni scheda AP1 per ogni unità montata	☐	☐

SPUNTARE LE UTENZE COLLEGATE NEL CONTROLLER:

☐ CFO Valvola a 3 vie
☐ ALL allarme
☐ INT resistenza o generatore calore ausiliario
☐ ACS resistenza elettrica ACS
☐ Ts sonda ACS
☐ Tc sonda integrazione
☐ Te sonda temperatura esterna
☐ Ip ingresso ON/Stby
☐ Im ingresso E/I
☐ Ie ingresso ECO
☐ s1 s2 ingresso SG ready

Indicare le temperature di esercizio richieste in merito alla tipologia dei terminali installati:

Pavimento/soffitto radiante		**Fan coil**		**Radiatori**	**A.C.S**
Caldo	Freddo	Caldo	Freddo		
---------- °C	---------- °C	----------°C	---------- °C	---------- °C	---------- °C

NOTE (facoltativo) _____

AVVERTENZE

IL GIORNO DEL PRIMO AVVIAMENTO, L'INSTALLATORE DOVRÀ GARANTIRE AL CENTRO ASSISTENZA DELEGATO QUANTO SEGUE:

- Presenza per tutta la durata del primo avviamento;
- Schemi idraulici ed elettrici dell'impianto;
- Unità esterna/e alimentata/e elettricamente da almeno 8 ore prima dell'appuntamento con il CAT, per consentire il pre-riscaldamento dell'olio del compressore.

IMPORTANTE

- Il seguente modulo deve essere inoltrato al seguente indirizzo mail: **argo.postvendita@argoclima.com**;
- Il Centro Assistenza verificherà che l'installazione sia congruente con il modulo compilato e conforme ai manuali d'installazione;
- Qualora il Centro Assistenza non possa eseguire il primo avviamento per problemi di impianto, la successiva richiesta di avviamento sarà a carico dell'installatore/cliente;
- Qualora l'unità sia collegata elettricamente ad una tensione non adeguata, non potrà essere eseguito l'avviamento;
- Qualora il primo avviamento del sistema non sia effettuato da uno nostro Centro Assistenza autorizzato, la garanzia decadrà automaticamente.

FIRMA PER PRESA VISIONE/CONOSCENZA

FIRMA RICHIEDENTE _____

TIMBRO RICHIEDENTE _____

NOTA PER IL CENTRO ASSISTENZA

- In caso di ricevimento di questo modulo dall'installatore, prego inoltrare lo stesso a: **argo.postvendita@argoclima.com.**
- Terminato l'avviamento, compilare debitamente il modulo di attestazione ufficiale Argoclima.
- Confermare che l'installatore abbia compilato il modulo per l'ispezione dell'installazione incluso nel manuale a corredo dell'unità.

NON INTERVENIRE SENZA AUTORIZZAZIONE
